



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495

“2019 Año del Desarrollo, las Inversiones y el Empleo”



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2019 (PERIODO OCTUBRE / DICIEMBRE 2019)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	REPARACION DE VIVIENDAS	EL CAMBRONAL	\$1,279,250.00				*	TERMINADA
2	REPARACION DE VIVIENDAS	VILLA ESPERANZA	\$1,279,250.00				*	TERMINADA
3	ACERAS Y CONTENES	LOS SANTOS	\$4,046,015.00				*	TERMINADA
4	REPARACION DE CAÑADA	HOYO DE LA VIUDA	\$2,260,993.00				*	TERMINADA
5	REPARACION DE CANCHA	MEJORAMIENTO SOCIAL	\$815,170.00				*	TERMINADA
6	TERMINACION DE CASA CLUB	GREGORIO LUPERÓN	\$3,297,128.00				*	EN EJECUCION
7	CONSTRUCCION DE CANCHA	VUELTA LARGA ABAJO	\$1,840,309.00				*	TERMINADA
8	CENTRO DE CAPACITACION	MIRAFLORES I	\$2,860,789.00				*	TERMINADA
9	ACERAS Y CONTENES	LOS SALADOS VIEJO	\$5,071,032.00				*	TERMINADA
10	REPARACION DE VIVIENDAS	MIRAFLORES II	\$1,842,120.00				*	TERMINADA
11	ACERAS Y CONTENES	NONON DIAZ	\$4,050,928.00				*	TERMINADA
12	TERMINACION DE PARQUE MUNICIPAL	FLOR DE GURABO	\$8,454,368.00				*	TERMINADA



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495

“2019 Año del Desarrollo, las Inversiones y el Empleo”



13	CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA	URB. EMPORIUM DORADO	\$4,746,242.00			*	TERMINADA
14	CENTRO DE CAPACITACION	HOYA DEL CAIMITO	\$4,779,867.00		*		EN EJECUCION
15	CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	LOS LAURELES	\$6,598,307.00			*	TERMINADA
16	TERMINACION DE PARQUE	URB. LA ESPAÑOLA	\$6,171,428.00			*	TERMINADA
17	ACERAS Y CONTENES	VILLA MARIA	\$1,191,167.00			*	TERMINADA
18	REPARACION DE VIVIENDAS	BARRIO LINDO (ZONA SUR)	\$1,586,570.00			*	TERMINADA
19	ARREGLO DE BADEN DE CALLE PROSPERIDAD	BARRIO OBRERO	\$469,036.00			*	TERMINADA
20	BACHEO DE CALLES	HATO MAYOR	\$2,741,997.00			*	TERMINADA
21	ENCAJONAMIENTO CAÑADA	LOS MANGOS (ZAMARRILLA)	\$2,827,144.00			*	TERMINADA
22	CANCHA DE BASQUETBOL	EMBRUJO III	\$2,550,910.00			*	TERMINADA
23	EMBELLECIMIENTO DE AREA PUBLICA	VALLE VERDE II (ZONA SUR)	\$4,638,341.00			*	TERMINADA
24	PARQUE INFANTIL	VALLE VERDE I (ZONA SUR)	\$5,570,159.00			*	TERMINADA
25	ACERAS Y CONTENES DE LOS CALLEJONES	EL PAPAYO I (LA CEIBITA)	\$3,540,199.00			*	TERMINADA
26	ACERAS Y CONTENES	EL PAPAYO II (LA CEIBITA)	\$3,253,159.00			*	TERMINADA



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495

“2019 Año del Desarrollo, las Inversiones y el Empleo”



27	REPARACION DE VIVIENDAS	VIETNAN	\$2,149,140.00				*	TERMINADA
28	ACERAS Y CONTENES	LO BRITO (REPARTO J.)	\$2,505,575.00				*	TERMINADA
29	CONSTRUCCION DE CANCHA	URB. YORYI MOREL	\$2,338,502.00				*	TERMINADA
30	ACERAS Y CONTENES	LAS CHARCAS	\$4,014,179.00				*	TERMINADA
31	ACERAS Y CONTENES	DON LEO (BARRANQUITA)	\$2,139,828.00				*	TERMINADA
32	ACERAS Y CONTENES	LOS BILLETEROS	\$3,353,121.00				*	TERMINADA
33	CENTRO DE CAPACITACION	LAS CAOBAS (ZONA SUR)	\$4,779,867.00		*			EN EJECUCION
34	ACERAS Y CONTENES	LOS PAULINOS	\$3,282,474.00				*	TERMINADA
35	ACERAS Y CONTENES	CIUDAD DE DIOS	\$3,458,068.00				*	TERMINADA
36	ACERAS Y CONTENES	VILLA PROGRESO III	\$3,064,361.00				*	TERMINADA
37	ACERAS Y CONTENES	LA UNION	\$2,169,468.00				*	TERMINADA
38	CENTRO DE CAPACITACION	BARRIO LA FE	\$3,958,485.00					(LA COMUNIDAD NO LLEGA A UN ACUERDO CON ESTA OBRA)
39	ACERAS Y CONTENES	BARRIO SAN MIGUEL	\$3,076,537.00				*	TERMINADA
40	ACERAS Y CONTENES	LOS GUANDULES	\$3,166,457.00				*	TERMINADA
41	CONSTRUCCION DE MURO Y RECONSTRUCCION DE PEATONES	EL SEMILLERO I (CIEN FUEGOS)	\$6,008,369.00				*	TERMINADA
42	CENTRO DE CAPACITACION	ALTO BONITO (CIEN FUEGO)	\$4,779,867.00			*		EN EJECUCION



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



"2019 Año del Desarrollo, las Inversiones y el Empleo"

43	CENTRO DE CAPACITACION	DON JAIME	\$3,321,883.00			*		EN EJECUCION
44	ACERAS Y CONTENES	LA PARADA 7	\$3,222,376.00				*	TERMINADA



LEONELA ESPINAL
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

Obras en Ejecucion

obra	Nombre de la Obra	Situacion Actual	Pres. Actual	Pagado a la fecha	balance
1	Centro de Capacitacion Tecnico Alto Bonito (Cien Fuegos)	En ejecucion	4,779,867.00	1,091,539.57	3,688,327.43
2	Centrode Capacitacion Tecnico Don Jaime	En ejecucion	3,321,883.00	961,051.92	2,360,831.08
3	Centro de Capacitación Técnico Hoya Del Caimito	En ejecucion	4,779,867.00	934,968.97	3,844,898.03
4	Centro de Capacitación Técnico Las caobas (zona sur)	En ejecucion	4,779,867.00	966,467.03	3,813,399.97
5	Terminación casa club Gregorio Luperón	En ejecucion	3,297,128.00	1,586,848.61	1,710,279.39
Total obras en Ejecucion		5	20,958,612.00	5,540,876.10	15,417,735.90

OBRAS PEDIENTE

1	Centro de Capacitación Tecnico Barrio La Fe	La Comunidad no se han puesto de acuerdo	3,958,485.00	835,761.30	3,122,723.70
Total Obras pendiente		1	3,958,485.00	835,761.30	3,122,723.70

OBRAS TERMINADA

1	Aceras y Contenes Club Rubén espino (los salados)	Terminada	5,071,032.00	5,071,032.00	0.00
2	Aceras y Contenes Don Leo (Barranquita)	Terminada	2,139,828.00	1,413,528.62	726,299.38
3	Aceras y Contenes Los Billeteros	Terminada	3,465,891.00	3,465,890.71	0.29
4	Aceras y Contenes Ciudad De Dios	Terminada	3,561,406.00	3,561,405.64	0.36



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

5	Aceras y Contenes de los Callejones El Papayo I (La Ceibita)	Terminada	3,540,199.00	3,346,008.03	194,190.97
6	Aceras y Contenes El Papayo II (La Ceibita)	Terminada	3,253,721.00	3,213,985.06	39,735.94
7	Aceras y Contenes LA PARADA 7	Terminada	3,222,376.00	2,221,199.19	1,001,176.81
8	Aceras y Contenes Las Charcas	Terminada	4,143,738.00	4,143,737.96	0.04
9	Aceras y Contenes Las Paulinas	Terminada	3,282,474.00	2,816,795.83	465,678.17
10	Aceras y Contenes los Santos	Terminada	4,046,015.00	4,046,015.00	0.00
11	Bacheo de Calles Hato Mayor	Terminada	2,741,997.00	2,102,646.90	639,350.10
12	Arreglos de Baden de calle Prosperidad Barrio Obrero	Terminada	469,036.00	407,118.65	61,917.35
13	Cancha de Embrujos III	Terminada	2,550,910.00	1,412,563.17	1,138,346.83
14	Construcción de cancha Urb. Yoryi Morel	Terminada	2,489,860.00	2,489,859.81	0.19
15	Construcción de cancha Vuelta Larga Abajo	Terminada	1,840,309.00	1,115,963.67	724,345.33
16	Reparación de cancha Mejoramiento social	Terminada	889,883.00	889,882.32	0.68
17	Construcción de parque Y Cancha Urb. Emporium Dorado	Terminada	4,746,242.00	4,388,712.10	357,529.90
18	Construcción de parque Municipal Los Laureles	Terminada	6,598,307.00	4,725,721.91	1,872,585.09
19	Terminación de parque Urb. La Española	Terminada	6,171,428.00	4,613,766.99	1,557,661.01
20	Terminación parque Municipal Flor De Gurabo	Terminada	8,454,368.00	7,572,985.89	881,382.11
21	Embellecimientos de área pública Valle Verde II (Zona Sur)	Terminada	4,638,341.00	4,299,206.85	339,134.15
22	Reparación de viviendas Cañada Hoyo de la Viudad	Terminada	2,260,992.00	2,260,992.00	0.00
23	Reparación de viviendas Villa Esperanza	Terminada	1,279,250.00	234,532.59	1,044,717.41



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

24	Construcción Parque infantil Valle Verde I (Zona Sur)	Terminada	5,570,159.00	4,571,146.47	999,012.53
25	Aceras y Contenes Jerusalén	Terminada	2,596,498.00	877,564.00	1,718,934.00
26	Aceras y Contenes La Union	Terminada	2,169,468.00	1,913,479.91	255,988.09
27	Reparación de viviendas EL Cambronal	Terminada	1,279,250.00	1,071,912.35	207,337.65
28	Aceras y Contenes Barrio San Miguel	Terminada	3,076,537.00	1,570,688.59	1,505,848.41
29	Aceras y Contenes Los Guandules	Terminada	3,166,457.00	1,425,756.48	1,740,700.52
30	Aceras y Contenes Nonon Díaz	Terminada	4,050,928.00	3,422,519.58	628,408.42
31	Aceras y Contenes Villa Maria	Terminada	1,191,167.00	1,191,167.00	0.00
32	Aceras y Contenes Villa Progreso III	Terminada	3,064,361.00	1,632,625.30	1,431,735.70
33	Centros de Capacitación Técnico Miraflores I	Terminada	2,860,789.00	843,580.88	2,017,208.12
34	Construcción de muro y Reconstrucción de peatones El Semillero I (Cien Fuegos)	Terminada	6,008,369.00	4,940,074.44	1,068,294.56
35	Reparación de viviendas Barrio Lindo (Zona Sur)	Terminada	1,586,570.00	1,133,638.45	452,931.55
36	Reparación de viviendas Miraflores II	Terminada	1,842,120.00	1,175,106.70	667,013.30
37	Reparación de viviendas Vietnam	Terminada	2,149,140.00	1,231,394.52	917,745.48
38	Encajonamiento Cañada Los Mangos (Zamarrilla)	Terminada	2,827,144.00	2,763,160.21	63,983.79
Total Terminadas		38	124,296,560.00	99,577,365.77	24,719,194.23
TOTAL GENERAL		44	149,213,657.00	105,954,003.17	43,259,653.83




ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019


Balance consolidado de la situación de las obras Presupuesto Participativos	Cantidad	cantidad de obras Porcentaje %	Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto Ejecutado en la obras	RD\$ % de Ejecutado	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	% por Ejecutar
Obras terminadas	38	86	124,296,560.00	99,577,365.77	80.11	24,719,194.23	19.89
Obras contratadas en ejecución	5	11	20,958,612.00	5,540,876.10	26.44	15,417,735.90	73.56
Obras Pendientes	1	2	3,958,485.00	835,761.30	21.11	3,122,723.70	78.89
TOTAL	44	100	149,213,657.00	105,954,003.17	71.01	43,259,653.83	28.99

Balance consolidado de la Situación de las Obras Presupuesto participativo 2019




■ Obras terminadas ■ Obras contratadas en ejecución ■ Obras Pendientes ■ TOTAL

Monto RD\$ Ejecutado Presupuesto Participativo 2019

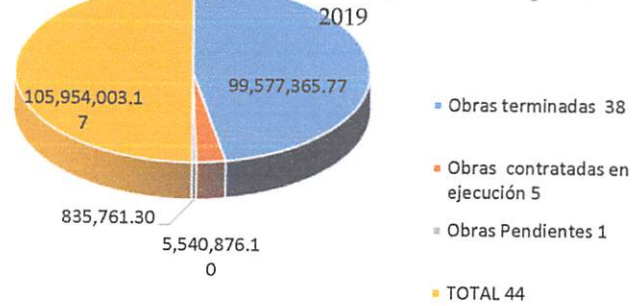

% Ejecutado Presupuesto Participativos 2019



■ Obras terminadas
■ Obras contratadas en ejecución
■ Obras Pendientes

Hilda Ovalles
Licda. Hilda Ovalles
Directora Administrativa





ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

PERIODO OCTUBRE / DICIEMBRE 2019

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras terminadas	38	86.36
Obras en ejecución	5	11.36
Obras paralizada	1	2.27
TOTAL	44	100.00

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo correspondiente al periodo 2019

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución
RD\$	RD\$	RD\$	%
149,213,657.00	105,954,003.17	43,259,653.83	71.01

Hilda Ovalles

Directora Administrativa

